**Climatización Ejemplo, S. L. (ficticia)**
CIF B00000000 · Habilitación RITE DEMO-RITE-0000
Certificado F-gas de empresa DEMO-FGAS-0000

Informe n.º
**2026-DEMO-A-0002**
Versión 1

# Mantenimiento preventivo

| | |
|---|---|
| Inicio de la visita | 10/11/2026 10:00 |
| Fin y firma | 10/11/2026 10:00 |

## Técnico

| | |
|---|---|
| Nombre | Lucía Ferrer (técnica ficticia) |
| Carné RITE | DEMO-TECNICO |
| Certificado F-gas | No consta |

## Titular e instalación

| | |
|---|---|
| Titular | Hotel Brisa del Puerto (ficticio) |
| CIF | B00000002 |
| Contacto | Javier Soler (mantenimiento) · 600 000 002 |
| Instalación | Climatización del hotel |
| Dirección | Avenida del Puerto 210, Valencia |
| Uso | Restantes usos |
| Expediente | — |
| Potencia declarada | 62 kW frío · 68 kW calor |
| Contrato / manual | Sí / Sí |

## Equipo: VRF · Cubierta, unidad exterior · Marca Ficticia VRF-400

| | |
|---|---|
| Marca y modelo | Marca Ficticia VRF-400 |
| N.º de serie | DEMO-HOTEL_VRF |
| Potencia | 40 kW frío · 45 kW calor |
| Refrigerante y carga | R-410A · 12 kg |
| Hermético / detección | No / No |
| Categoría F-gas | Aire acondicionado o bomba de calor |

**F-gas: 12 kg R-410A: 25,05 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027**
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
RITE: Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027


| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4 | Filtros de aire: revisar y limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería interior (evaporador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9 | Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8 | Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir | OK | | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.3 Tabla 3.3, 37 (UNE 100012) | Conductos y plenum visibles: estancos, aislados y sujetos | OK | | |

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 6 | Recuperador de calor (si lo hay): revisar y limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería exterior (condensador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Compresor: arranque, ruido y vibración | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3 | Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas) | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13 | Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14 | Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor) | OK | | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de retorno | OK | 22,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de impulsión | OK | 32,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Salto térmico entre retorno e impulsión | OK | 15 K | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 2 | Temperatura del aire exterior | — | 15 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6 | Presión de alta (condensación), manométrica | OK | 24 bar (man.) | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5 | Presión de baja (evaporación), manométrica | OK | 7,75 bar (man.) | |
| Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2) | Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada) | OK | 75,25 A | |
| Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2 | Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla) | OK | | |

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

## Fotos

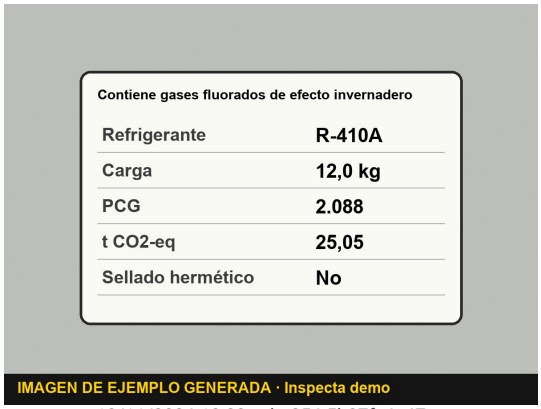

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

## Equipo: Rooftop · Cubierta, sobre el comedor · Marca Ficticia RT-180

| | |
|---|---|
| Marca y modelo | Marca Ficticia RT-180 |
| N.º de serie | DEMO-HOTEL_ROOFTOP |
| Potencia | 18 kW frío · 19 kW calor |
| Refrigerante y carga | R-407C · 8 kg |
| Hermético / detección | No / No |
| Categoría F-gas | Aire acondicionado o bomba de calor |


**F-gas: 8 kg R-407C: 14,19 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027**
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
RITE: Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027

| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4 | Filtros de aire: revisar y limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería interior (evaporador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9 | Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8 | Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir | OK | | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.3 Tabla 3.3, 37 (UNE 100012) | Conductos y plenum visibles: estancos, aislados y sujetos | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 6 | Recuperador de calor (si lo hay): revisar y limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería exterior (condensador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Compresor: arranque, ruido y vibración | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3 | Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas) | OK | | |

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13 | Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14 | Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor) | OK | | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de retorno | OK | 22,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de impulsión | OK | 32,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Salto térmico entre retorno e impulsión | OK | 15 K | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 2 | Temperatura del aire exterior | — | 15 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6 | Presión de alta (condensación), manométrica | OK | 24 bar (man.) | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5 | Presión de baja (evaporación), manométrica | OK | 7,75 bar (man.) | |
| Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2) | Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada) | OK | 75,25 A | |
| Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2 | Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla) | OK | | |

## Fotos

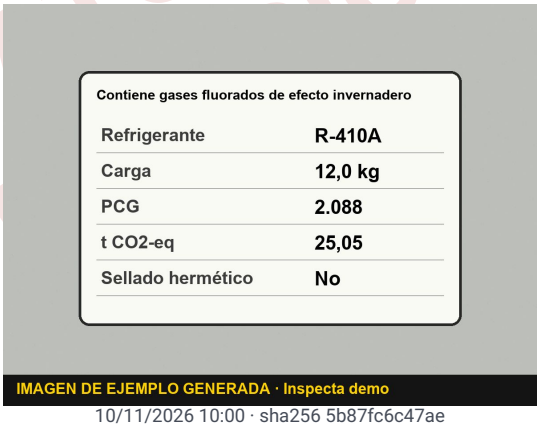


10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

DATOS DE EJEMPLO

## Equipo: Split · Recepción · Marca Ficticia SPL-26

| | |
|---|---|
| Marca y modelo | Marca Ficticia SPL-26 |
| N.º de serie | DEMO-HOTEL_SPLIT |
| Potencia | 2,6 kW frío · 3,2 kW calor |
| Refrigerante y carga | R-32 · 1,1 kg |
| Hermético / detección | No / No |
| Categoría F-gas | Aire acondicionado o bomba de calor |


**F-gas: 1,1 kg R-32: 0,74 t CO2-eq · no sujeto a control de fugas**
Menos de 5 t CO2-eq (art. 5.1)
RITE: Preventivo RITE cada 24 meses · próximo 10/11/2028

| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4 | Filtros de aire: revisar y limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería interior (evaporador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9 | Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8 | Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1 | Batería exterior (condensador): limpiar | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3 | Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas) | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13 | Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14 | Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas | OK | | |
| RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10 | Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor) | OK | | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de retorno | OK | 22,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Temperatura del aire de impulsión | OK | 32,5 °C | |
| Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1 | Salto térmico entre retorno e impulsión | OK | 15 K | |
| Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2) | Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada) | OK | 20,1 A | |

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

| Código | Operación | Resultado | Valor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2 | Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla) | OK | | |

## Fotos

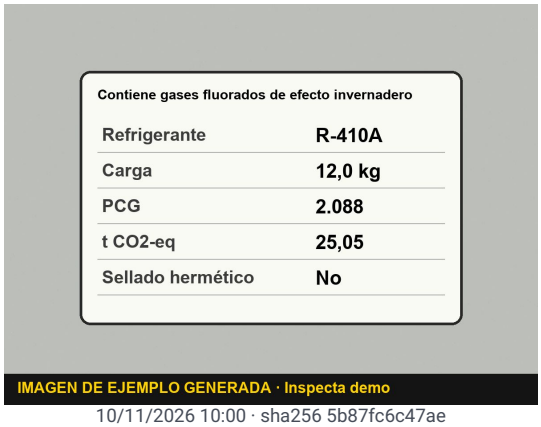


10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

## Resumen

Preventivo en Climatización del hotel (Hotel Brisa del Puerto (ficticio)): 3 equipos revisados, 66 de 66 puntos respondidos. 0 defectos y 0 observaciones.

## Próximos vencimientos

| Equipo | F-gas | RITE |
|---|---|---|
| VRF · Cubierta, unidad exterior · Marca Ficticia VRF-400 | 12 kg R-410A: 25,05 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027 | Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027 |
| Rooftop · Cubierta, sobre el comedor · Marca Ficticia RT-180 | 8 kg R-407C: 14,19 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027 | Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027 |
| Split · Recepción · Marca Ficticia SPL-26 | 1,1 kg R-32: 0,74 t CO2-eq · no sujeto a control de fugas | Preventivo RITE cada 24 meses · próximo 10/11/2028 |

*Mantenido según el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación y la IT 3 del RITE.*

## Firmas

Por el titular

Javier Soler, Mantenimiento
10/11/2026 10:00

Técnico

Lucía Ferrer
10/11/2026 10:00

Firma electrónica simple. El titular debe conservar este documento al menos 5 años (art. 27 RITE; art. 7 Reglamento (UE) 2024/573).

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS
