Climatización Ejemplo, S. L. (ficticia)
CIF B00000000 · Habilitación RITE DEMO-RITE-0000
Certificado F-gas de empresa DEMO-FGAS-0000

Informe n.º
2026-DEMO-A-0002
Versión 1

Control de fugas

Inicio de la visita	10/11/2026 10:00
Fin y firma	10/11/2026 10:00

Técnico

Nombre	Lucía Ferrer (técnica ficticia)
Carné RITE	DEMO-TECNICO
Certificado F-gas	No consta

Titular e instalación

Titular	Oficinas Ejemplo, S. L. (ficticia)
CIF	B00000003
Contacto	Elena Navarro (servicios generales) · 600 000 003
Instalación	Edificio de oficinas
Dirección	Calle de la Industria 5, Paterna
Uso	Restantes usos
Expediente	—
Potencia declarada	210 kW frío · 30 kW calor
Contrato / manual	Sí / Sí

Equipo: Enfriadora · Cubierta · Marca Ficticia ENF-1800

Marca y modelo	Marca Ficticia ENF-1800
N.º de serie	DEMO-OFICINA_ENFRIADORA
Potencia	180 kW frío · — calor
Refrigerante y carga	R-134a · 60 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor

F-gas: 60 kg R-134a: 85,8 t CO2-eq · control cada 6 meses · próximo 10/05/2027
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6


RITE: Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 7.1	Registro del aparato revisado: cargas y fugas anteriores	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Uniones, abocardados y soldaduras: sin aceite ni fuga	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Válvulas de servicio y obuses: sin fuga y con tapón	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Compresor y sus conexiones: sin rastro de aceite	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Baterías interior y exterior: sin fuga ni corrosión	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Tuberías: sin roces, golpes ni vibraciones	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Presostatos, transductores y capilares: sin fuga	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6	Presión de alta (condensación), manométrica	OK	24 bar (man.)	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5	Presión de baja (evaporación), manométrica	OK	7,25 bar (man.)	
Rgto. (UE) 2024/573 art. 6.3 si es obligatorio (art. 6.1-6.2); si no, buena práctica	Sistema de detección de fugas (si lo hay): funciona y avisa	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 4.5	Titular informado del resultado (si hay fuga, reparar sin demora)	OK		

Fotos

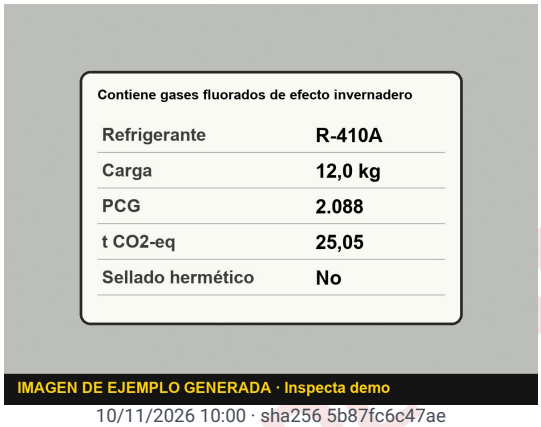

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

Control de fugas

Método	Detector	Resultado	Localización	Reparada	Nuevo control
—	—	Fuga	Válvula de servicio	Sí	Entre el 11/11/2026 y el 10/12/2026

Movimientos de gas (art. 7)

Tipo	Gas	kg	Origen	Gestor	Regla
carga	R-134a	1,5	virgen		ninguna

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Equipo: Split · Sala de servidores · Marca Ficticia SPL-70

Marca y modelo	Marca Ficticia SPL-70
N.º de serie	DEMO-OFICINA_SPLIT
Potencia	7 kW frío · 7,5 kW calor
Refrigerante y carga	R-410A · 2,5 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor


F-gas: 2,5 kg R-410A: 5,22 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 10/11/2027
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6

RITE: Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 7.1	Registro del aparato revisado: cargas y fugas anteriores	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Uniones, abocardados y soldaduras: sin aceite ni fuga	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Válvulas de servicio y obuses: sin fuga y con tapón	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Compresor y sus conexiones: sin rastro de aceite	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Baterías interior y exterior: sin fuga ni corrosión	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Tuberías: sin roces, golpes ni vibraciones	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Presostatos, transductores y capilares: sin fuga	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6	Presión de alta (condensación), manométrica	OK	24 bar (man.)	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5	Presión de baja (evaporación), manométrica	OK	7,25 bar (man.)	
Rgto. (UE) 2024/573 art. 6.3 si es obligatorio (art. 6.1-6.2); si no, buena práctica	Sistema de detección de fugas (si lo hay): funciona y avisa	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 4.5	Titular informado del resultado (si hay fuga, reparar sin demora)	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Fotos

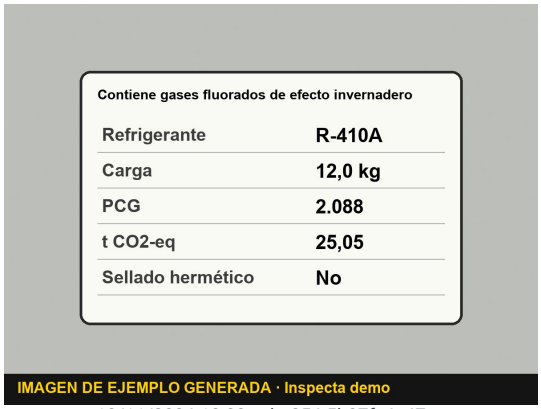

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

Equipo: Conductos · Planta baja, recepción · Marca Ficticia CND-200

Marca y modelo	Marca Ficticia CND-200
N.º de serie	DEMO-OFICINA_CONDUCTOS
Potencia	20 kW frío · 22 kW calor
Refrigerante y carga	R-32 · 7,5 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor


F-gas: 7,5 kg R-32: 5,06 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 10/11/2027
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
RITE: Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 7.1	Registro del aparato revisado: cargas y fugas anteriores	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Uniones, abocardados y soldaduras: sin aceite ni fuga	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Válvulas de servicio y obuses: sin fuga y con tapón	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Compresor y sus conexiones: sin rastro de aceite	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Baterías interior y exterior: sin fuga ni corrosión	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Tuberías: sin roces, golpes ni vibraciones	OK		
Rgto. (UE) 2024/573 art. 5.1	Presostatos, transductores y capilares: sin fuga	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6	Presión de alta (condensación), manométrica	OK	24 bar (man.)	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5	Presión de baja (evaporación), manométrica	OK	7,25 bar (man.)	
Rgto. (UE) 2024/573 art. 6.3 si es obligatorio (art. 6.1-6.2); si no, buena práctica	Sistema de detección de fugas (si lo hay): funciona y avisa	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 4.5	Titular informado del resultado (si hay fuga, reparar sin demora)	OK		

Fotos

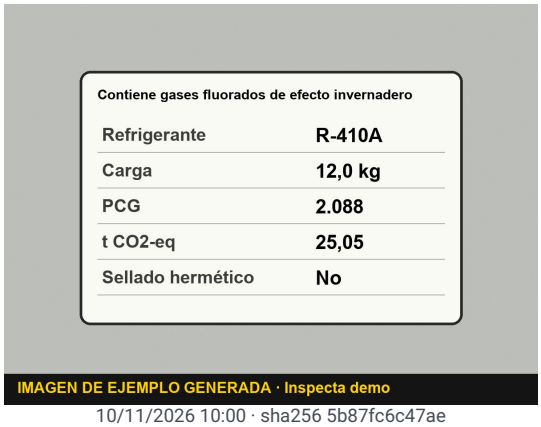

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

Resumen

Control

Próximos vencimientos

Equipo	F-gas	RITE
Enfriadora · Cubierta · Marca Ficticia ENF-1800	60 kg R-134a: 85,8 t CO2-eq · control cada 6 meses · próximo 10/05/2027	Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP
Split · Sala de servidores · Marca Ficticia SPL-70	2,5 kg R-410A: 5,22 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 10/11/2027	Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP
Conductos · Planta baja, recepción · Marca Ficticia CND-200	7,5 kg R-32: 5,06 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 10/11/2027	Preventivo RITE mensual (instalación de más de 70 kW): plantilla fuera del MVP

Firmas

Por el titular

Elena Navarro
10/11/2026 10:00

Técnico

Lucía Ferrer
10/11/2026 10:00

Firma electrónica simple. El titular debe conservar este documento al menos 5 años (art. 27 RITE; art. 7 Reglamento (UE) 2024/573).

EJEMPLOS DE EJEMPLO
