Climatización Ejemplo, S. L. (ficticia)
CIF B00000000 · Habilitación RITE DEMO-RITE-0000
Certificado F-gas de empresa DEMO-FGAS-0000

Informe n.º
2026-DEMO-A-0002
Versión 1

Mantenimiento preventivo

Inicio de la visita	10/11/2026 10:00
Fin y firma	10/11/2026 10:00

Técnico

Nombre	Lucía Ferrer (técnica ficticia)
Carné RITE	DEMO-TECNICO
Certificado F-gas	No consta

Titular e instalación

Titular	Hotel Brisa del Puerto (ficticio)
CIF	B00000002
Contacto	Javier Soler (mantenimiento) · 600 000 002
Instalación	Climatización del hotel
Dirección	Avenida del Puerto 210, Valencia
Uso	Restantes usos
Expediente	—
Potencia declarada	62 kW frío · 68 kW calor
Contrato / manual	Sí / Sí

Equipo: VRF · Cubierta, unidad exterior · Marca Ficticia VRF-400

Marca y modelo	Marca Ficticia VRF-400
N.º de serie	DEMO-HOTEL_VRF
Potencia	40 kW frío · 45 kW calor
Refrigerante y carga	R-410A · 12 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor

F-gas: 12 kg R-410A: 25,05 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
RITE: Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027


Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4	Filtros de aire: revisar y limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería interior (evaporador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9	Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8	Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.3 Tabla 3.3, 37 (UNE 100012)	Conductos y plenum visibles: estancos, aislados y sujetos	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 6	Recuperador de calor (si lo hay): revisar y limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería exterior (condensador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Compresor: arranque, ruido y vibración	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3	Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas)	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13	Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14	Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor)	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de retorno	OK	22,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de impulsión	OK	32,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Salto térmico entre retorno e impulsión	OK	15 K	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 2	Temperatura del aire exterior	—	15 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6	Presión de alta (condensación), manométrica	OK	24 bar (man.)	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5	Presión de baja (evaporación), manométrica	OK	7,75 bar (man.)	
Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2)	Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada)	OK	75,25 A	
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Fotos

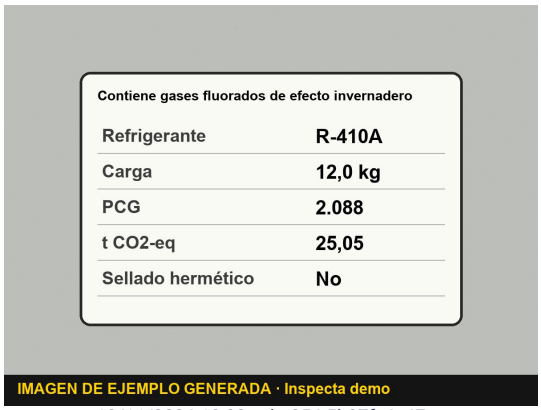

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

Equipo: Rooftop · Cubierta, sobre el comedor · Marca Ficticia RT-180

Marca y modelo	Marca Ficticia RT-180
N.º de serie	DEMO-HOTEL_ROOFTOP
Potencia	18 kW frío · 19 kW calor
Refrigerante y carga	R-407C · 8 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor


F-gas: 8 kg R-407C: 14,19 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027
Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
RITE: Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4	Filtros de aire: revisar y limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería interior (evaporador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9	Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8	Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.3 Tabla 3.3, 37 (UNE 100012)	Conductos y plenum visibles: estancos, aislados y sujetos	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 6	Recuperador de calor (si lo hay): revisar y limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería exterior (condensador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Compresor: arranque, ruido y vibración	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3	Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas)	OK		

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13	Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14	Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor)	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de retorno	OK	22,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de impulsión	OK	32,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Salto térmico entre retorno e impulsión	OK	15 K	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 2	Temperatura del aire exterior	—	15 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 6	Presión de alta (condensación), manométrica	OK	24 bar (man.)	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 5	Presión de baja (evaporación), manométrica	OK	7,75 bar (man.)	
Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2)	Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada)	OK	75,25 A	
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		

Fotos

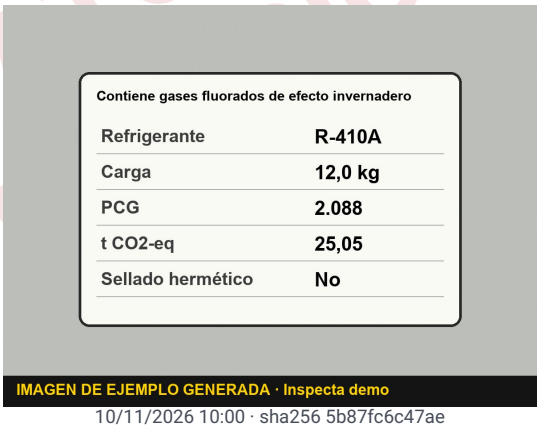

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

DATOS DE EJEMPLO

Equipo: Split · Recepción · Marca Ficticia SPL-26

Marca y modelo	Marca Ficticia SPL-26
N.º de serie	DEMO-HOTEL_SPLIT
Potencia	2,6 kW frío · 3,2 kW calor
Refrigerante y carga	R-32 · 1,1 kg
Hermético / detección	No / No
Categoría F-gas	Aire acondicionado o bomba de calor


F-gas: 1,1 kg R-32: 0,74 t CO2-eq · no sujeto a control de fugas
Menos de 5 t CO2-eq (art. 5.1)
RITE: Preventivo RITE cada 24 meses · próximo 10/11/2028

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 4	Filtros de aire: revisar y limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería interior (evaporador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Bandeja y desagüe de condensados: limpios y evacuando	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 9	Ventilador interior: limpio, sin ruidos ni vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 8	Rejillas y difusores: limpios, fijos y sin obstruir	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 1	Batería exterior (condensador): limpiar	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Ventilador exterior: aspas, ruidos y vibraciones	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Soportes y antivibratorios: fijos y sin corrosión	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 3	Estanquidad y nivel de refrigerante y aceite (sin manchas)	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 13	Aislamiento de las líneas frigoríficas, sobre todo a la intemperie	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Conexiones y cableado eléctrico: apretados y en buen estado	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 a) 14	Mando, termostato y control: funcionan y consignas correctas	OK		
RITE IT 3.3 Tabla 3.2 b) 10	Funciona en frío y en calor (si es bomba de calor)	OK		
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de retorno	OK	22,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Temperatura del aire de impulsión	OK	32,5 °C	
Buena práctica · ref. RITE IT 3.4.2 Tabla 3.3, 1	Salto térmico entre retorno e impulsión	OK	15 K	
Buena práctica (intensidad por fase; no es la potencia de la IT 3.4.2)	Intensidad absorbida (en trifásico, la fase más cargada)	OK	20,1 A	

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS

Código	Operación	Resultado	Valor	Observación
Rgto. (UE) 2024/573 art. 12.3-12.4 · RD 115/2017 art. 10.2	Etiqueta F-gas presente y legible (si el gas es fluorado; si falta, colocarla)	OK		

Fotos

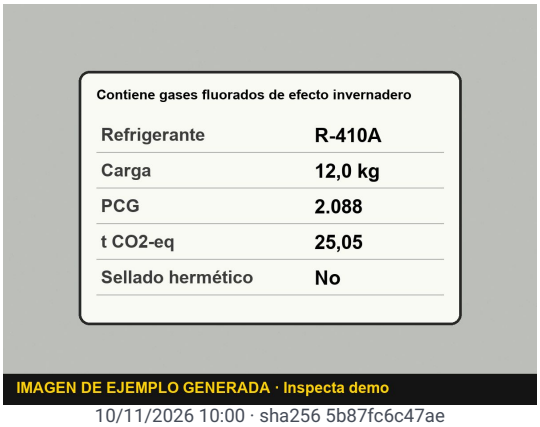

10/11/2026 10:00 · sha256 5b87fc6c47ae

Resumen

Preventivo en Climatización del hotel (Hotel Brisa del Puerto (ficticio)): 3 equipos revisados, 66 de 66 puntos respondidos. 0 defectos y 0 observaciones.

Próximos vencimientos

Equipo	F-gas	RITE
VRF · Cubierta, unidad exterior · Marca Ficticia VRF-400	12 kg R-410A: 25,05 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027	Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027
Rooftop · Cubierta, sobre el comedor · Marca Ficticia RT-180	8 kg R-407C: 14,19 t CO2-eq · control cada 12 meses · próximo 24/04/2027	Preventivo RITE cada 12 meses · próximo 10/11/2027
Split · Recepción · Marca Ficticia SPL-26	1,1 kg R-32: 0,74 t CO2-eq · no sujeto a control de fugas	Preventivo RITE cada 24 meses · próximo 10/11/2028

Mantenido según el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación y la IT 3 del RITE.

Firmas

Por el titular

Javier Soler, Mantenimiento
10/11/2026 10:00

Técnico

Lucía Ferrer
10/11/2026 10:00

Firma electrónica simple. El titular debe conservar este documento al menos 5 años (art. 27 RITE; art. 7 Reglamento (UE) 2024/573).

DATOS DE EJEMPLO FICTICIOS
